COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ

REFORMA DO PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL

- **Ref.: PA-10621AD/2013, Contrato nº 48/2014, O.S.- 006/2014. Valor: R$ 6.244.912,26**

- **1º ADITIVO DA REFORMA PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL**
- **Referencia: PA-2086AD/2015. Valor: R$ 379.497,18; SERV SUPRIMIDOS: R$ 170.220,19**

- **2º ADITIVO DA REFORMA PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL**
- **Referencia: PA-11155AD/2015. Valor: R$ 381.986,59; SERV SUPRIMIDOS: R$ 383.642,04.**
- **O 3º ADITIVO FOI SOMENTE DE PRAZO.**

- **4º ADITIVO DA REFORMA PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL**
- **Referencia: PA-5601AD/2016. Valor: R$ 835.158,31; SERV SUPRIMIDOS: R$ 318.524,71**

- **5º ADITIVO DA REFORMA PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL**
- **Referencia: PA-10287AD/2016. Valor: R$ 210.880,99; SERV SUPRIMIDOS: R$ 81.588,30**

- **6º ADITIVO DA REFORMA PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL**
- **Referencia: PA-14802AD/2016. Valor: R$ 410.612,56; SERV SUPRIMIDOS: R$ 93.066,42**
- **O 7º ADITIVO FOI SOMENTE DE PRAZO.**

- **8º ADITIVO DA REFORMA PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL**
- **Referencia: PA-14802AD/2016. Valor: R$ 101.947,70; SERV SUPRIMIDOS: R$ 15.341,68**

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ

ASSUNTO: REFORMA PRÉDIO SEDE - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL

P.A. E CONTRATO	OBRA	MED	DATA	VALOR	EMPRESA	INICIO	PREV FIM	O.S
PA-10621AD/2013 CONT. 048-2014	REFORMA DO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL	1ª	06/08/2014	R$ 132.945,95	CONSTUTORA DOMUS LTDA	26/06/2014	12/04/2017	006/2014
		2ª	19/09/2014	R$ 101.145,59				
		3ª	10/12/2014	R$ 157.865,51				
		4ª	03/02/2015	R$ 93.456,04				
		5ª	06/03/2015	R$ 100.471,73				
		6ª	28/04/2015	R$ 96.421,07				
		7ª	11/16/2015	R$ 91.743,17				
		8ª	31/07/2015	R$ 130.357,32				
		9ª	10/09/2015	R$ 51.286,26				
		10ª	26/10/2015	R$ 101.226,22				
		11ª	09/12/2015	R$ 362.431,80				
		12ª	18/12/2015	R$ 217.220,46				
		13	01/02/2016	R$ 112.476,91				
		14ª	01/03/2016	R$ 251.331,42				
		15ª	28/03/2016	R$ 106.562,92				
		16ª	02/05/2016	R$ 604.751,56				
		17ª	24/05/2016	R$ 222.756,78				

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ

ASSUNTO: REFORMA PRÉDIO SEDE - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL

(CONTINUAÇÃO PLANILHAS)

PA-10621AD/2013 CONT. 048-2014	REFORMA DO PREDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL	18ª	21/06/2016	R$ 155.411,35	CONST. DOMUS LTDA	26/06/14	12/04/14	006/2014
		19ª	04/08/2016	R$ 138.913,41				
		20ª	26/08/2016	R$ 54.307,94				
		21ª	29/09/2016	R$ 101.686,01				
		22ª	03/11/2016	R$ 158.460,05				
		23ª	19/12/2016	R$ 288.431,75				
		24ª	22/12/2016	R$ 71.033,13				
		25ª	08/02/2017	R$ 54.498,97				
		26ª	04/05/2017	R$ 97.100,87				
		27ª	19/06/2017	R$ 82.793,77				
		28ª	17/07/2017	R$ 78.151,43				
		29ª	12/09/2017	R$ 65.532,12				
		30ª	29/09/2017	R$ 56.274,72				
PA-2086AD/2015	1º ADIT. PREDIO PROM. JUST CAP.	1ª	08/07/2014	R$ 189.745,22	CONSTRUTORA DOMUS			006/2014
		2ª	31/07/2014	R$ 155.949,43				
		3ª	25/02/2016	R$ 12.234,93				
		4ª	29/03/2016	R$ 8.241,96				
		5ª	05/05/2016	R$ 8.241,96				
		6ª	02/08/2016	R$ 2.501,19				
PA-11155AD/2015	2º ADIT. PREDIO PROM. JUST CAP.	1ª	28/01/2016	R$ 60.844,86	CONSTRUTORA DOMUS			006/2014
		2ª	26/02/2016	R$ 22.757,70				
		3ª	29/03/2016	R$ 6.738,49				
		4ª	05/05/2016	R$ 10.008,41				
		5ª	23/05/2016	R$ 15.416,55				
		6ª	23/06/2016	R$ 108.523,92				
		7ª	02/08/2016	R$ 14.004,08				
		8ª	30/08/2016	R$ 14.413,28				
		9ª	29/09/2016	R$ 23.383,33				
		10ª	03/11/2016	R$ 27.646,60				
		11ª	19/12/2016	R$ 15.318,91				
		12ª	22/12/2016	R$ 1.201,72				
		13ª	08/02/2017	R$ 17.996,78				
		14ª	04/05/2017	R$ 6.281,92				
		15ª	19/06/2017	R$ 7.059,14				
		16ª	17/07/2017	R$ 12.632,76				

COORDENADORIA DE OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA - PGJ

ASSUNTO: REFORMA PRÉDIO SEDE - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL

(CONTINUAÇÃO PLANILHAS)

PA-5601AD/2016	4º ADIT. PREDIO PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAP.	1ª	08/08/2016	R$ 66.734,18	CONSTRUTORA DOMUS			006/2014
		2ª	31/08/2016	R$ 9.634,42				
		3ª	29/09/2016	R$ 12.929,65				
		4ª	03/11/2016	R$ 31.588,74				
		5ª	19/12/2016	R$ 65.439,99				
		6ª	22/12/2016	R$ 13.220,48				
		7ª	08/02/2017	R$ 40.511,90				
		8ª	04/05/2017	R$ 36.013,95				
		9ª	19/06/2017	R$ 15.408,94				
		10ª	17/07/2017	R$ 43.741,42				
		11ª	12/09/2017	R$ 24.569,09				
		12ª	29/09/2017	R$ 186.872,18				
PA-10287AD/2016	5º ADIT. PREDIO PROM. JUST CAP.	1ª	03/11/2016	R$ 12.036,86	CONST. DOMUS			006/2014
		2ª	19/12/2016	R$ 7.637,63				
		3ª	22/12/2016	R$ 15.904,87				
		4ª	08/02/2017	R$ 71.495,99				
		5ª	04/05/2017	R$ 639,46				
		6ª	MUITO PEQUENA DESCONSIDERARAM					
		7ª	17/07/2017	R$ 69.154,40				
		8ª	12/09/2017	R$ 700,87				
		9ª	29/09/2017	R$ 11.269,24				
PA-14802AD/2016	6º ADIT. PREDIO PROM. JUST. DA CAPITAL	1ª	08/02/2017	R$ 47.205,24	CONST. DOMUS		09/12/2017	006/2014
		2ª	04/05/2017	R$ 2.208,95				
		3ª	MUITO PEQUENA DESCONSIDERARAM					
		4ª	17/07/2017	R$ 17.383,36				
		5ª	12/09/2017	R$ 27.755,42				
		6ª	29/09/2017	R$ 15.000,42				
PA-14802AD/2016	8º ADIT. PREDIO PROM. JUST. DA CAPITAL	1ª	17/07/2017	R$ 56.990,87	CONST. DOMUS		09/12/2017	006/2014
		2ª	12/09/2017	R$ 12.113,72				
		3ª	29/09/2017	R$ 10.070,40				

ATUALIZADO EM 20-NOVEMBRO-2017

Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663 e-mail: coea@mp.ma.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FACHADA FRONTAL

MURETA E GRADE FRONTAL

FACHADA FUNDOS SENDO REVESTIDA

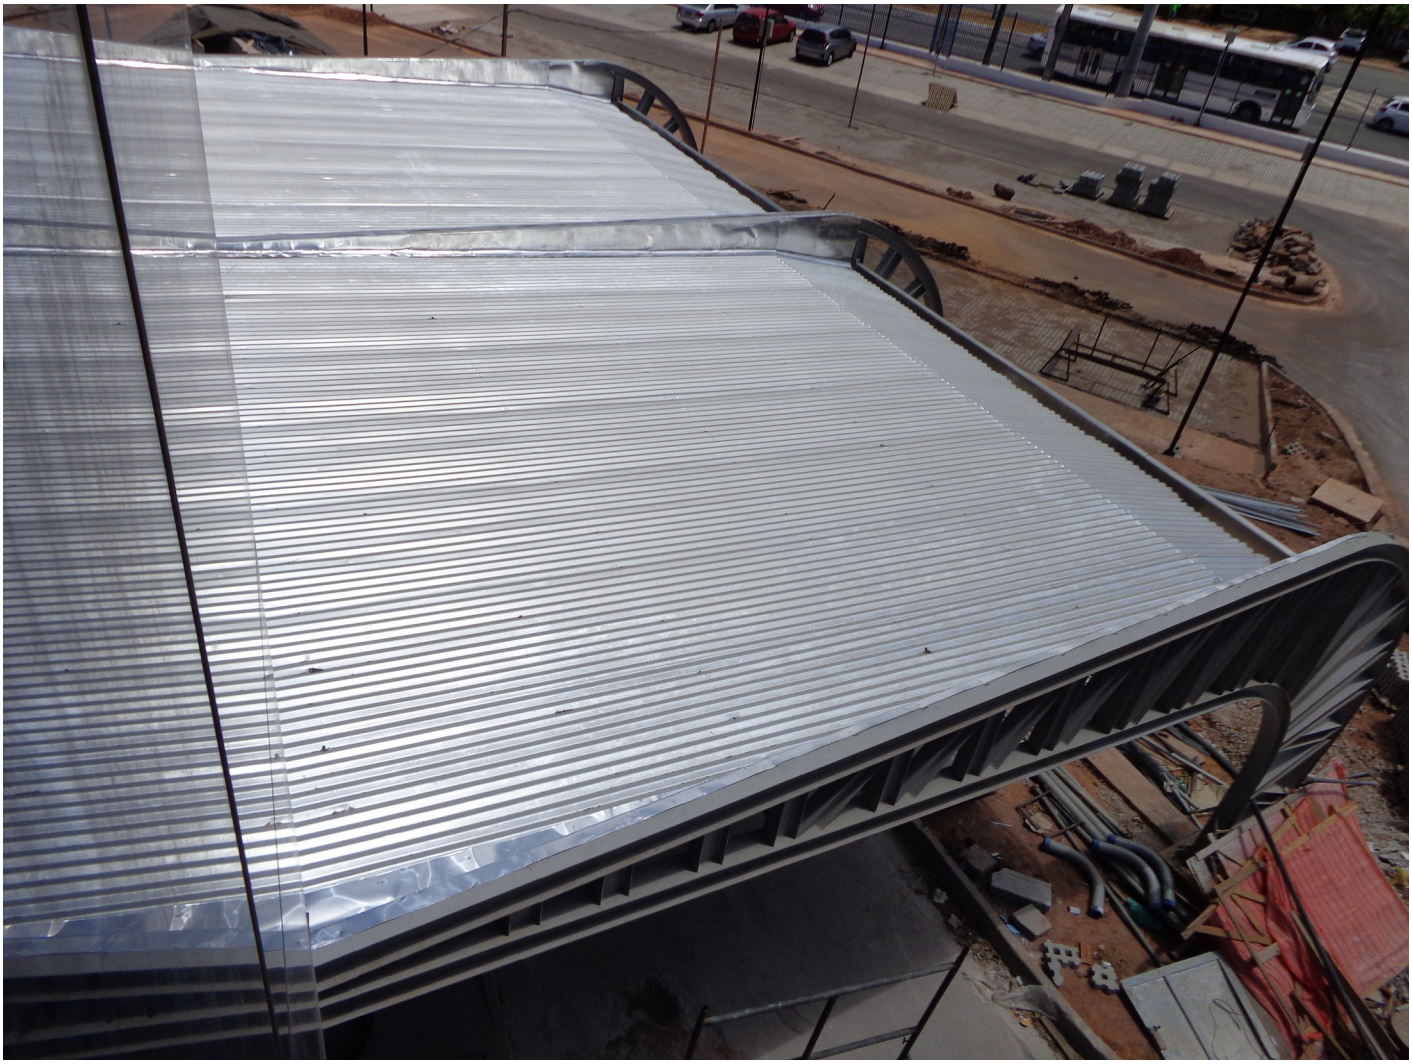

COBERTURA MARQUISE ENTRADA

LAJE DA SALA DA DIRETORIA. VISTA EXTERNA.

BANCADAS DE UM DOS BANHEIROS

UM DOS BANHEIROS

PIA DE UMA COPA

Rua Oswaldo Cruz, 1396 – Centro – CEP: 65020-910 – São Luís/MA
Telefones: (98) 3219-1663 *e-mail: coea@mp.ma.gov.br*
